




Ministério
do Esporte



Copa 2014: Situação das ações do Governo Brasileiro

Brasília, 5 de maio de 2011

Ciclos de planejamento para a Copa

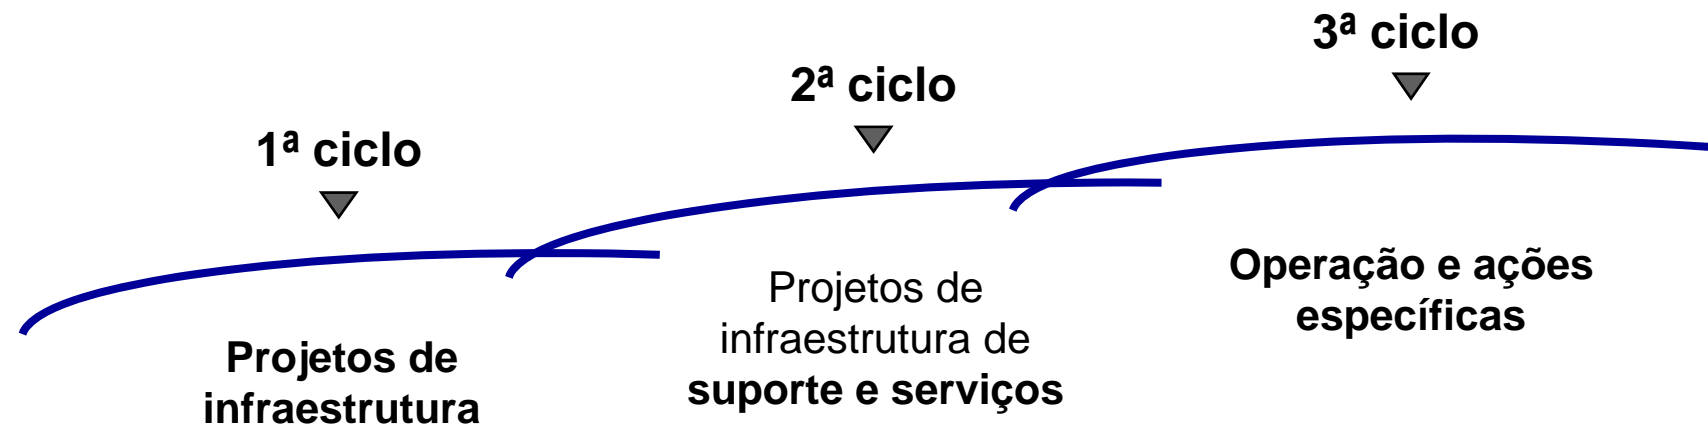

- **Definição de projetos** - assinados na Matriz de Responsabilidades:
 - 12 estádios
 - 50 em mobilidade urbana
 - 25 em 13 aeroportos
 - 7 em portos

- **Em discussão:**
 - Segurança
 - Infraestrutura turística
 - Telecomunicações e TI
 - Energia
 - Saúde
 - Sustentabilidade ambiental
 - Promoção e comunicação do país

- **A serem discutidos:**
 - Malha aérea, operação aeroportuária e portuária
 - Transporte e mobilidade urbana
 - Fornecimento de energia
 - Saúde, prevenção e pronto-socorro
 - Estruturas temporárias para a Copa

← 2009-2010 → ← 2010 – 2011 / 1º sem → ← 2011-2013 →



Estruturas do Governo Federal para definição e coordenação das ações

Definição pelo decreto do Presidente da República de 14 de janeiro de 2010

○ CGCOPA (Comitê Gestor)
● GECOPA (Grupo Executivo)



Objetivos do CGCOPA

Definir, aprovar e supervisionar as ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa

Objetivos do GECOPA


Coordenar e consolidar as ações, estabelecer metas e monitorar os resultados de implementação e execução das ações para a Copa



1º Ciclo de Planejamento: R\$ 23, 8 bilhões de investimentos programados

R\$ bilhões

- Orçamento Federal
- Financiamento Federal
- Recursos Locais

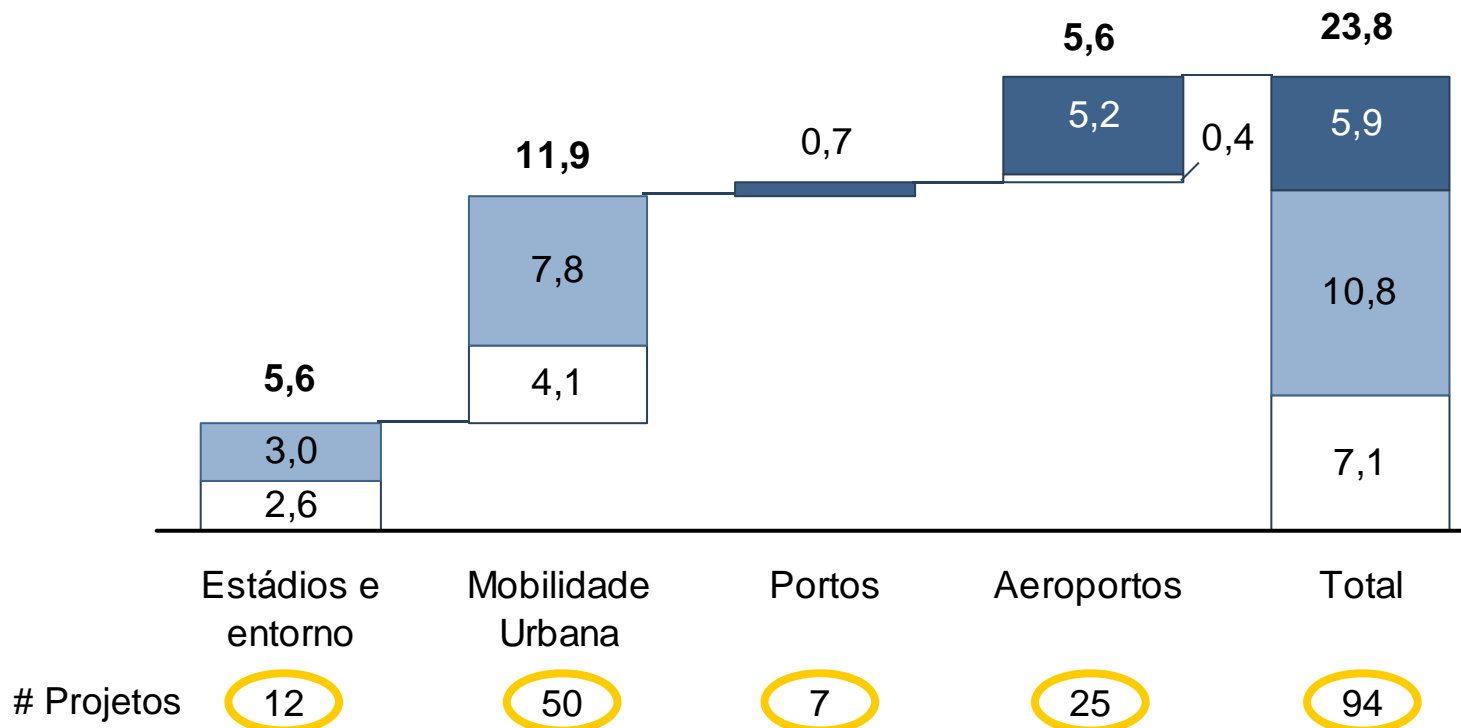


- +
- Segurança
 - Desenvolvimento Turístico
 - Sustentabilidade Ambiental
 - Telecomunicações e TI
 - Energia
 - Saúde



Estádios: 10 obras foram iniciadas e deverão ganhar ritmo em 2011 – São Paulo e Natal ainda não iniciaram

Referência: Abril/2011


■ Real
□ Previsto

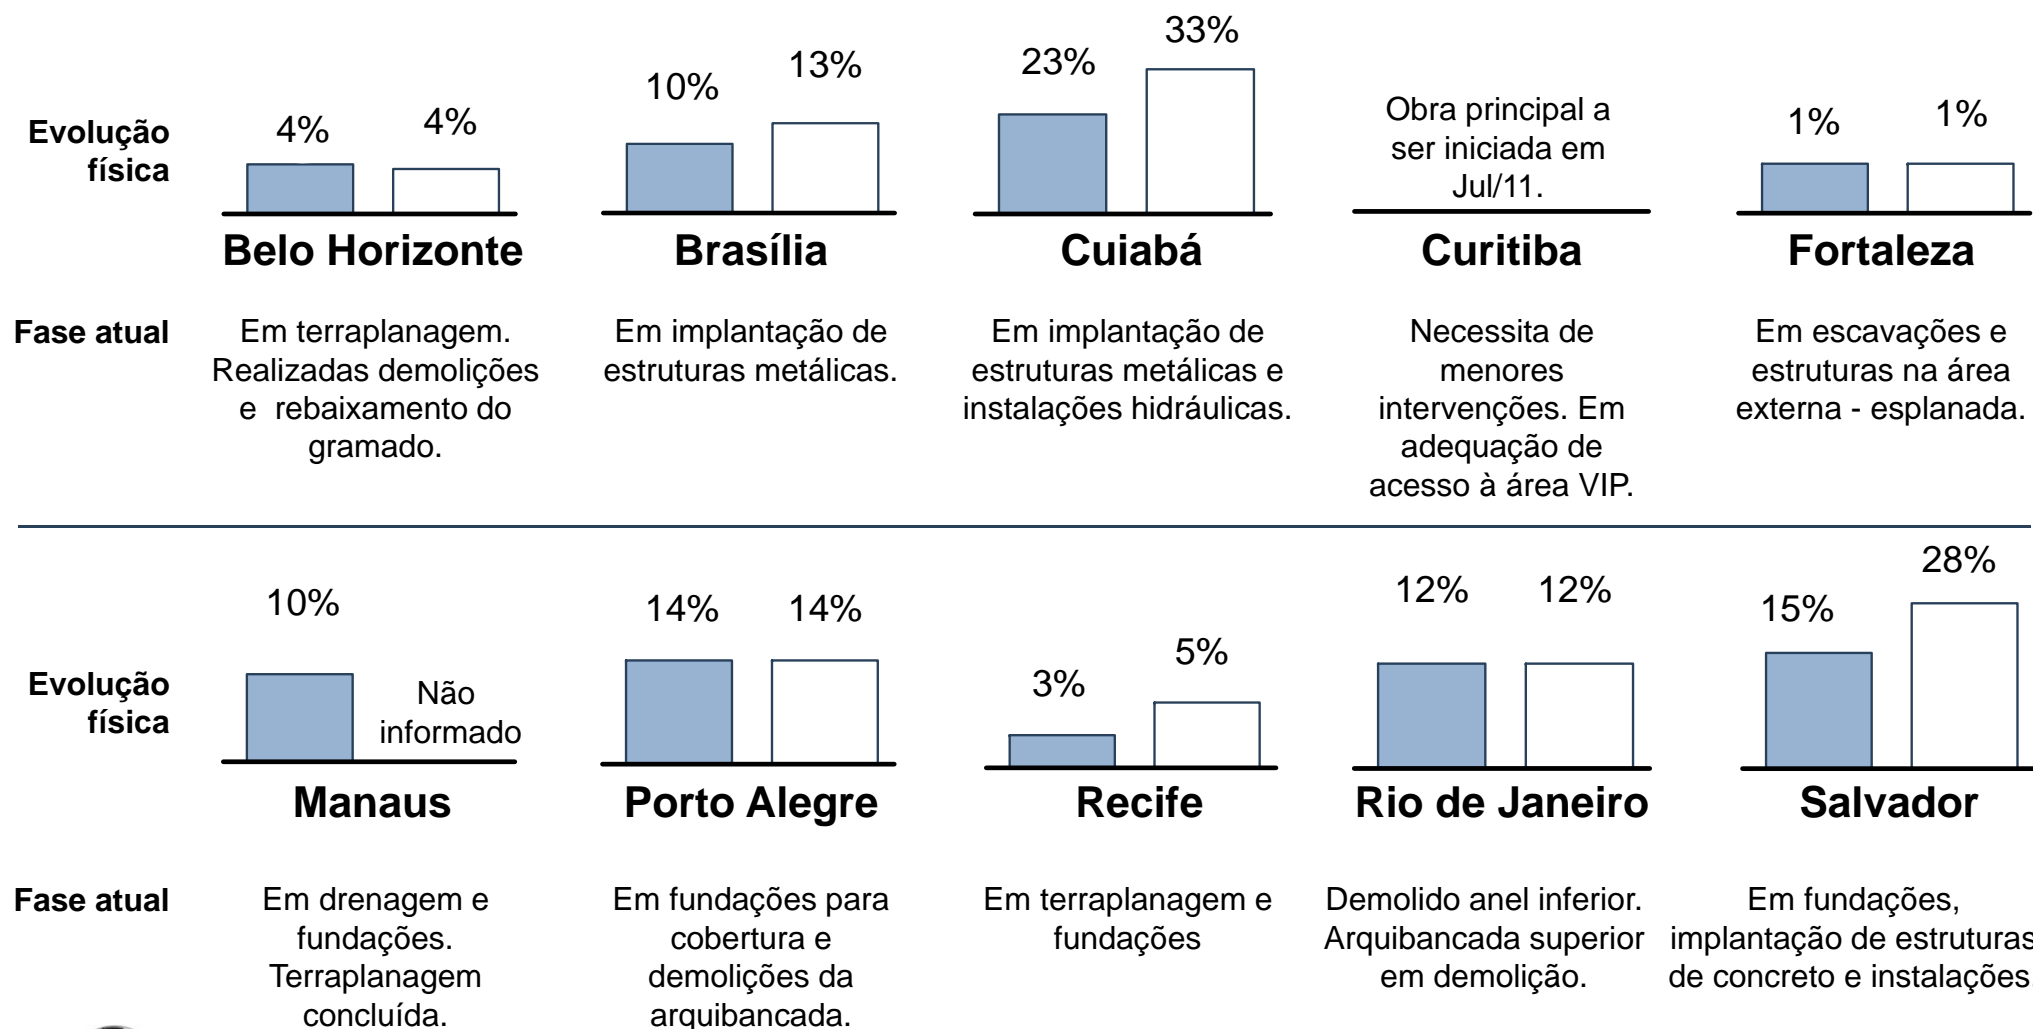

Mobilidade Urbana: reprogramação seguida dos cronogramas com previsão de entrega de 40% das obras no 2º semestre de 2013


Impacto na entrega das obras:

Distribuição dos projetos por data de entrega das obras, de acordo com marcos de monitoramento

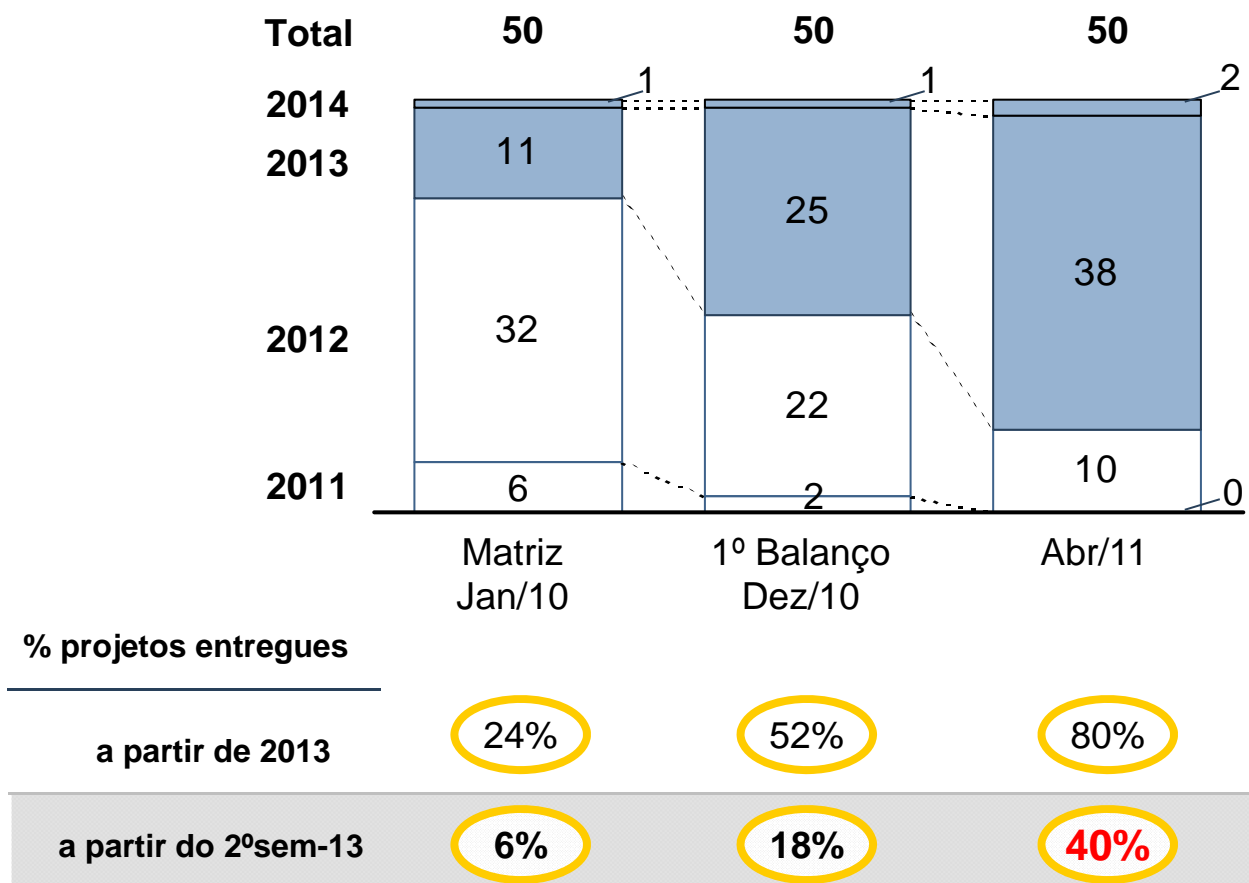

Aeroportos: 22 empreendimentos com atraso em relação à Matriz de Responsabilidades

Abr/11

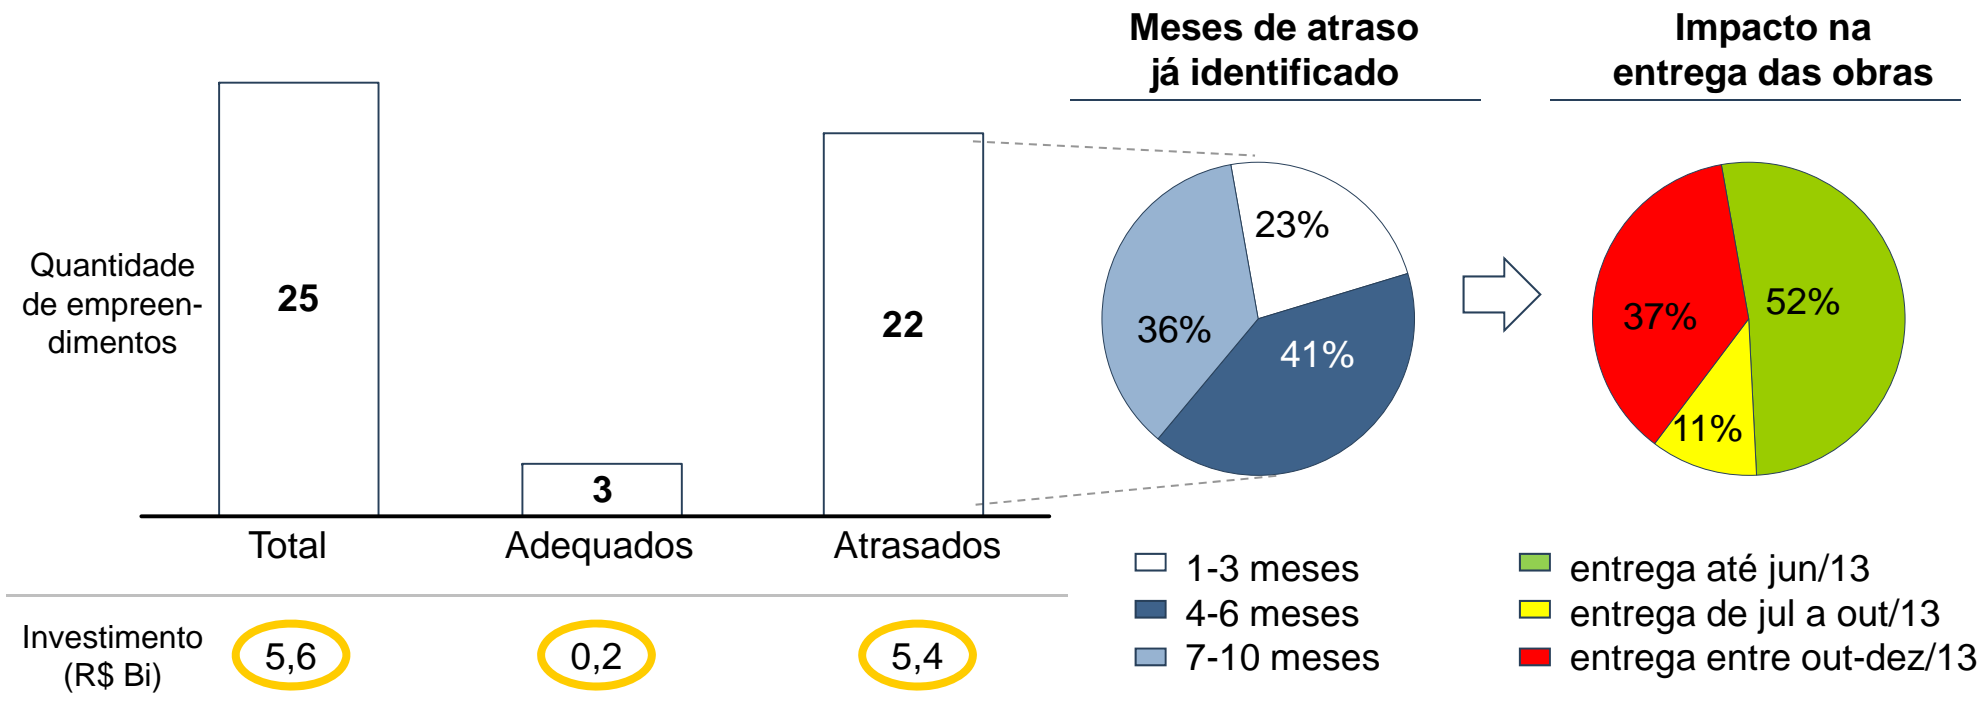

Detalhe dos Empreendimentos

- Em planejamento:
 - BSB – MOP
 - GRU – MOP 2
- Em obras:
 - Natal – Pista e Pátio
- 3 na etapa de planejamento
- 4 em licitação de projetos
- 8 em elaboração de projetos
- 5 em licitação de obras
- 2 em obra


- A Infraero está revisando os cronogramas de obras com a possibilidade de antecipação ou faseamento das obras
- Estão sendo realizados estudos pela Secretaria de Aviação Civil e pela Infraero para concessões



Portos: Risco na entrega das obras dos portos de Manaus, Santos e Rio de Janeiro

Investimento nos 7 Portos para a Copa em R\$, mi
Panorama de previsão de início e conclusão de obras

- Entrega até Jul/13
- Entrega de Jul a Nov/13
- Entrega após Nov/13

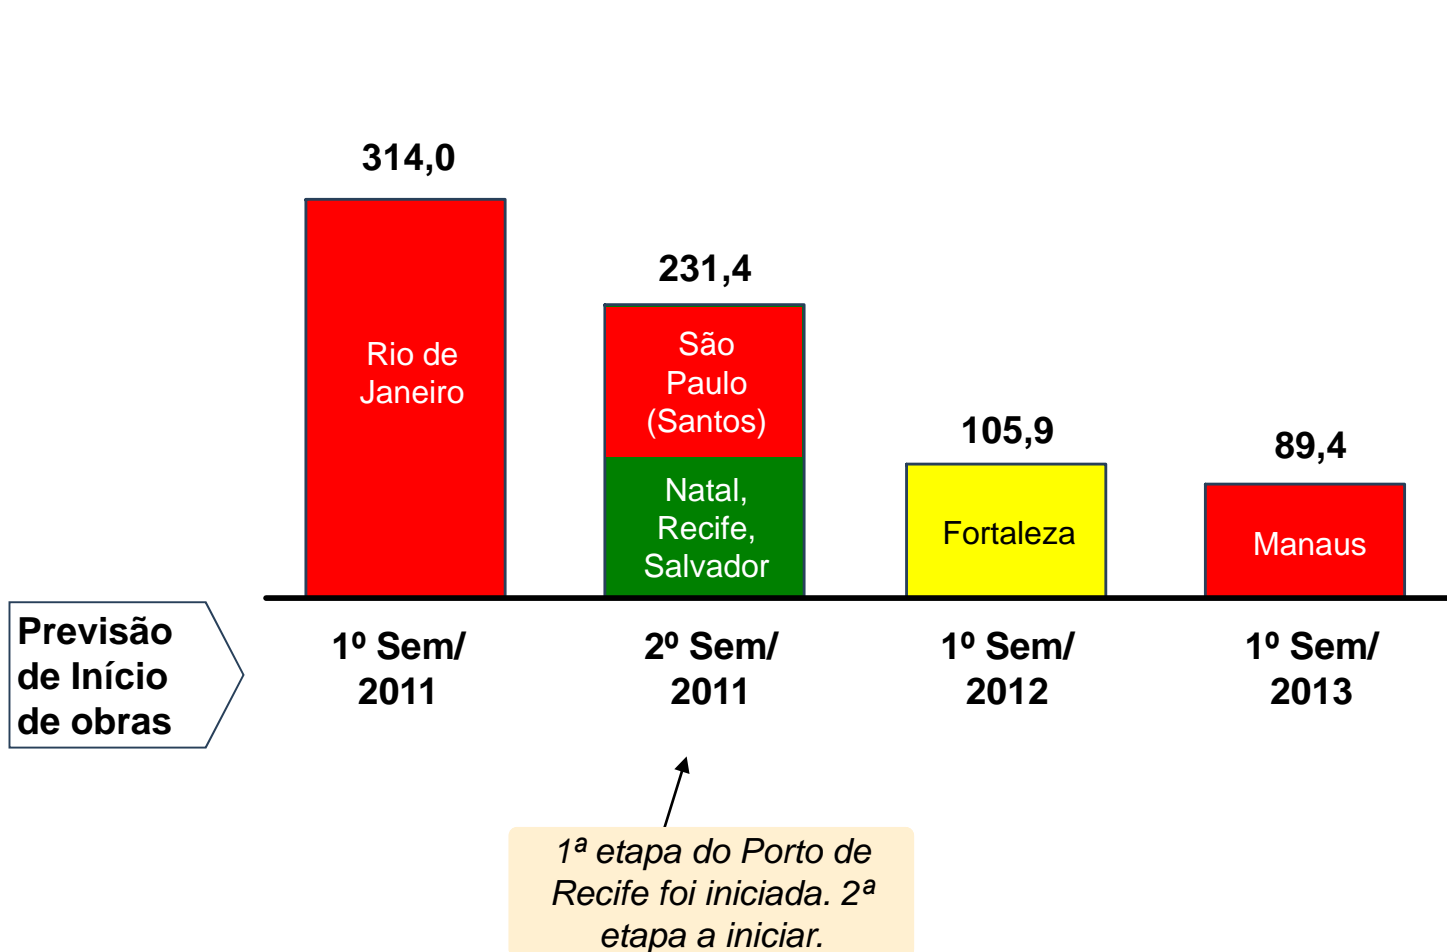

Pontos de Atenção

- Manaus**
- Em processo de retomada pela União. MT concedeu prazo adicional de 90 dias para retomada do Porto.
 - Conclusão prevista para mar/14
- São Paulo (Santos)**
- Revisão do projeto. Conclusão para abr/14
- Rio de Janeiro**
- Conclusão da obra prevista para Mar/14 - Licitação publicada em 03/mar - edital a ser republicado
- Fortaleza**
- Lançamento do edital de obras apenas em Set/11 em função da obtenção das licenças ambientais: LP em Ago/11 e LI em Nov/11.

